



## KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

# 2017 YILI KARAYOLU YATIRIMLARI



# KARAYOLLARI YATIRIMLARI



S.N.	PROJENİN ADI	BAŖLAMA VE BİTİŖİ TARİHİ	PROJE BEDELİ	FİZİKİ GER. %
1	(Kütahya-Afyon) Ayr. - Çavdarhisar İKMAL (8,6 km BY-BSK)	2016-2018	25.630.000	8%
2	Çavdarhisar-Gediz-Abide-2.Bl.Hd. Eksik Kalan Kesimler İKMAL (5,2 km BY-BSK)	2017-2018	118.940.000	0%
3	Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Yolunun BY-BSK Tamamlanması	2017-2020	42.770.000	0%
4	Abide-Simav Yolu, Km: 0+000-15+000 Arası	2017-2020	170.000.000	0%
5	Tunçbilek-Domaniç Arası	2012-2019	25.187.000	42%
6	Çavdarhisar-Örencik-Emet Ayr. İKMAL	2016-2019	29.671.000	12%
7	Balıköy-Dağardı-Simav Yolu, Km:57+000-67+000 Arası	2016-2018	11.543.000	0%
8	Tavşanlı-Emet, Km: 0+000-19+000 Arası	2017-2019	97.230.000	0%
9	Hisarcık-Simav İKMAL	2017-2019	98.820.000	3%
10	Kütahya-Tavşanlı Yolundaki Eksik Kalan Sanat Yapıları ve Kavşak İnşaatı İŖi	2016-2017	10.564.000	93%
11	Bozüyük-Kütahya-Afyon Yolunda Eksik Kalan Sanat Yapıları ve Kavşak İnşaatı İŖi	2016-2017	5.035.000	40%
12	Tavşanlı-Tunçbilek (Tunçbilek Ŗehir GeçiŖi Dahil) BSK İkmal	2017-2017	9.000.000	0%
13	Kütahya İlindeki Tarihi Çavdarhisar Aizonai ve Yukarı Köprüsü	2015-2017	1.434.000	45%
14	Hisarcık-Gediz İl Yolu Hisarcık Ŗehir İçi GeçiŖinde, Hisarcık Köprüsü ve Tavşanlı-Kuruçay Yolunda, Ada-1 Köprüsü Yapım İŖi	2016-2017	7.876.000	40%

## KÜTAHYA-ÇAVDARHİSAR İKMAL PROJESİ

Proje Uzunluğu : 45,6 km


Standardı : BY-BSK

Proje Bedeli : 25.630.000 TL

TOPLAM	2016 SONU	2017 HEDEF	2017 BİTEN	KALAN
BY ÇALIŞMALARI				
45,6	37	5	0	8,6
BSK ÇALIŞMALARI				
45,6	37	5	0	8,6



2017 yılında 5 km BY-BSK yol yapımı hedeflenmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

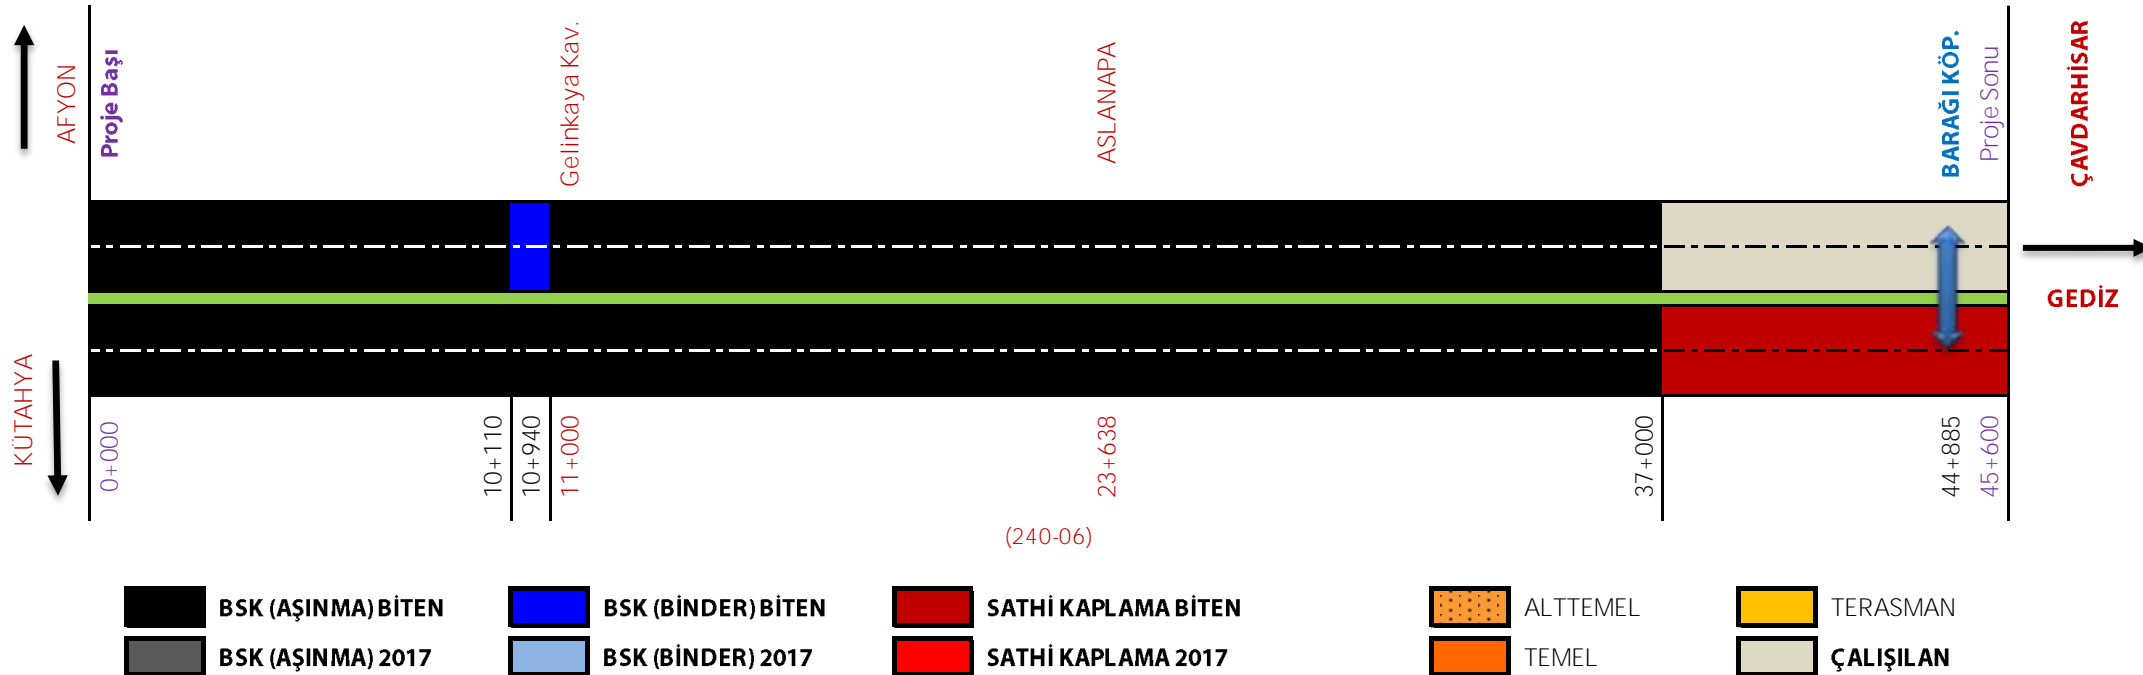

# KÜTAHYA – ÇAVDARHİSAR İKİMAL




## ÇAVDARHİSAR-GEDİZ-ABİDE-2.BL.HD. İKMAL İNŞAATI

Proje Uzunluğu	:	60,6 km
Standardı	:	BY-BSK
Proje Bedeli	:	118.940.000 TL
Yüklenici	:	<b>İHALE AŞAMASINDA</b>

TOPLAM	2016 SONU	2017 HEDEF	2017 BİTEN	KALAN
<b>BY ÇALIŞMALARI</b>				
60,6	55,4	0	0	5,2
<b>BSK ÇALIŞMALARI</b>				
60,6	55,4	0	0	5,2



1-) Kalan 5,2 km kesimin tamamlanması için ihalesi 16.03.2017 tarihinde yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir.

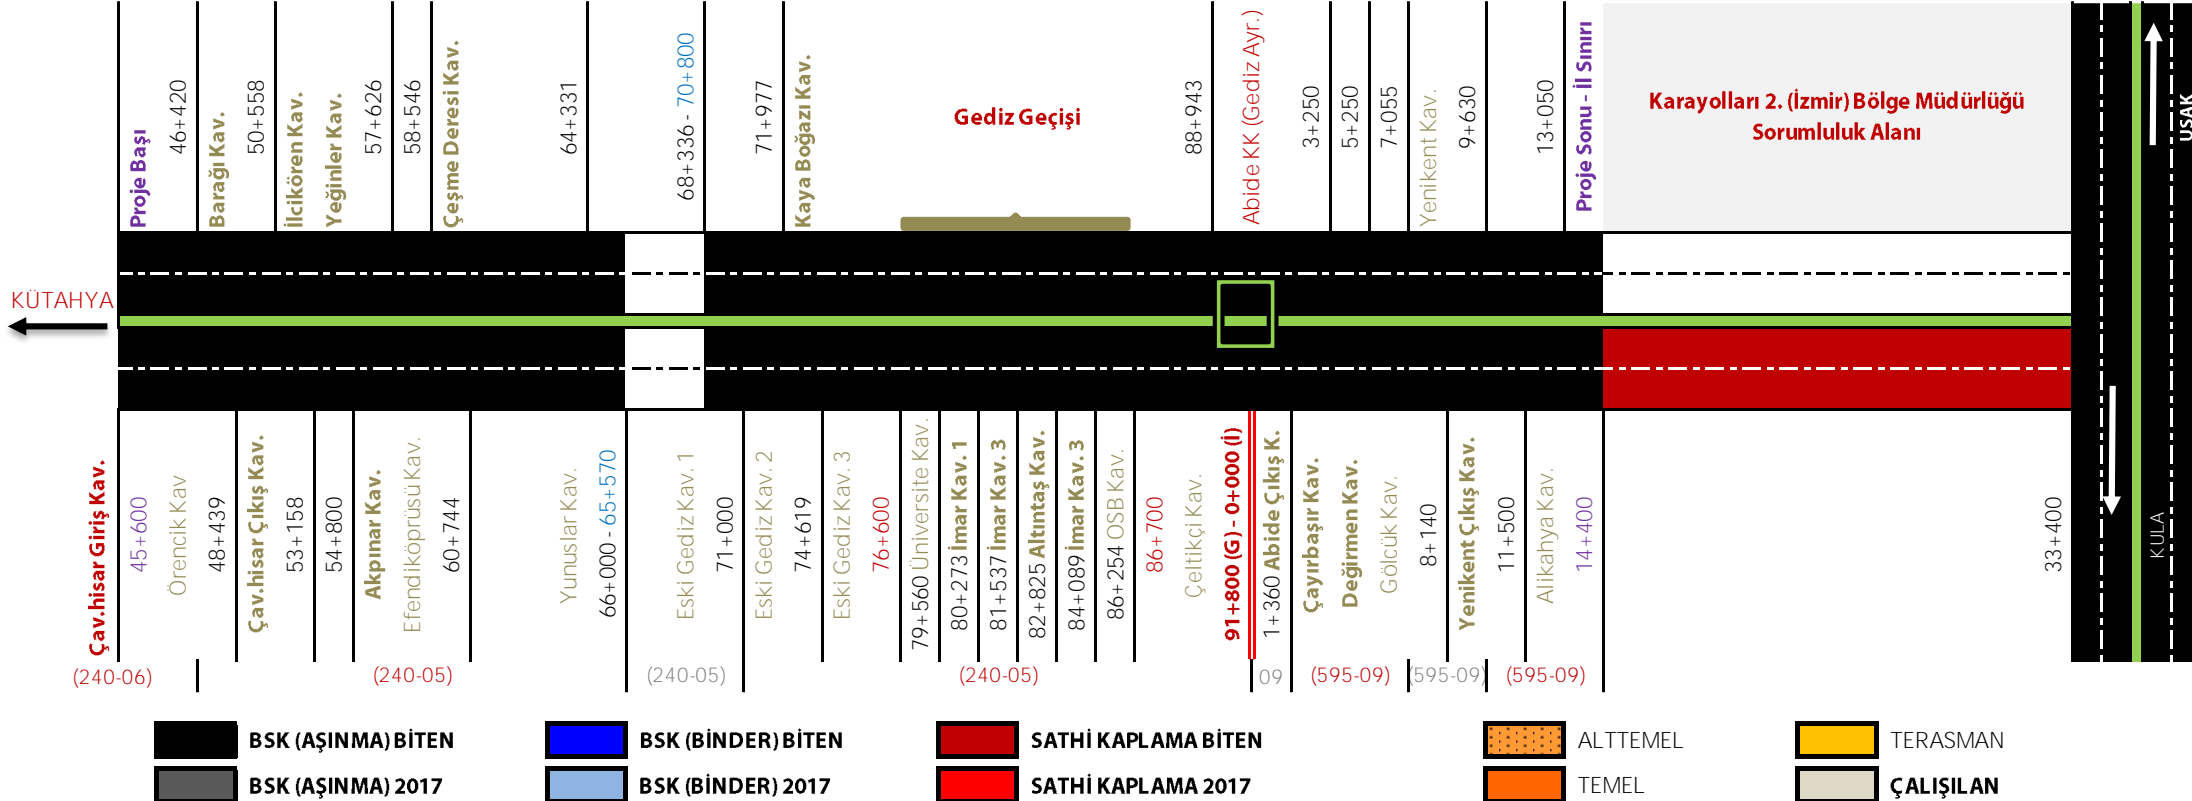


# DURSUNBEY-HARMANCIK-TAVŞANLI YOLU İKMAL İNŞAATI

Proje Uzunluğu	:	89,9 km
Standardı	:	BY-BSK
Proje Bedeli	:	212.400.000 TL
Yüklenici	:	İHALE AŞAMASINDA

TOPLAM	2016 SONU	2017 HEDEF	2017 BİTEN	KALAN
BY ÇALIŞMALARI				
89,9	41,5	0	0	48,4
BSK ÇALIŞMALARI				
89,9	0,3	0	0	89,6



- 1-) Dursunbey - Harmancık - Tavşanlı Yolunun; **38,5 km'si Balıkesir**, **27,6 km'si Bursa** ve **23,8 km'si Kütahya** ilindedir.
- 2-) Yolun BY-BSK tamamlanması yapım işi 23.01.2017 tarihinde ihale edilmiş olup ihale sonrası süreç devam etmektedir.

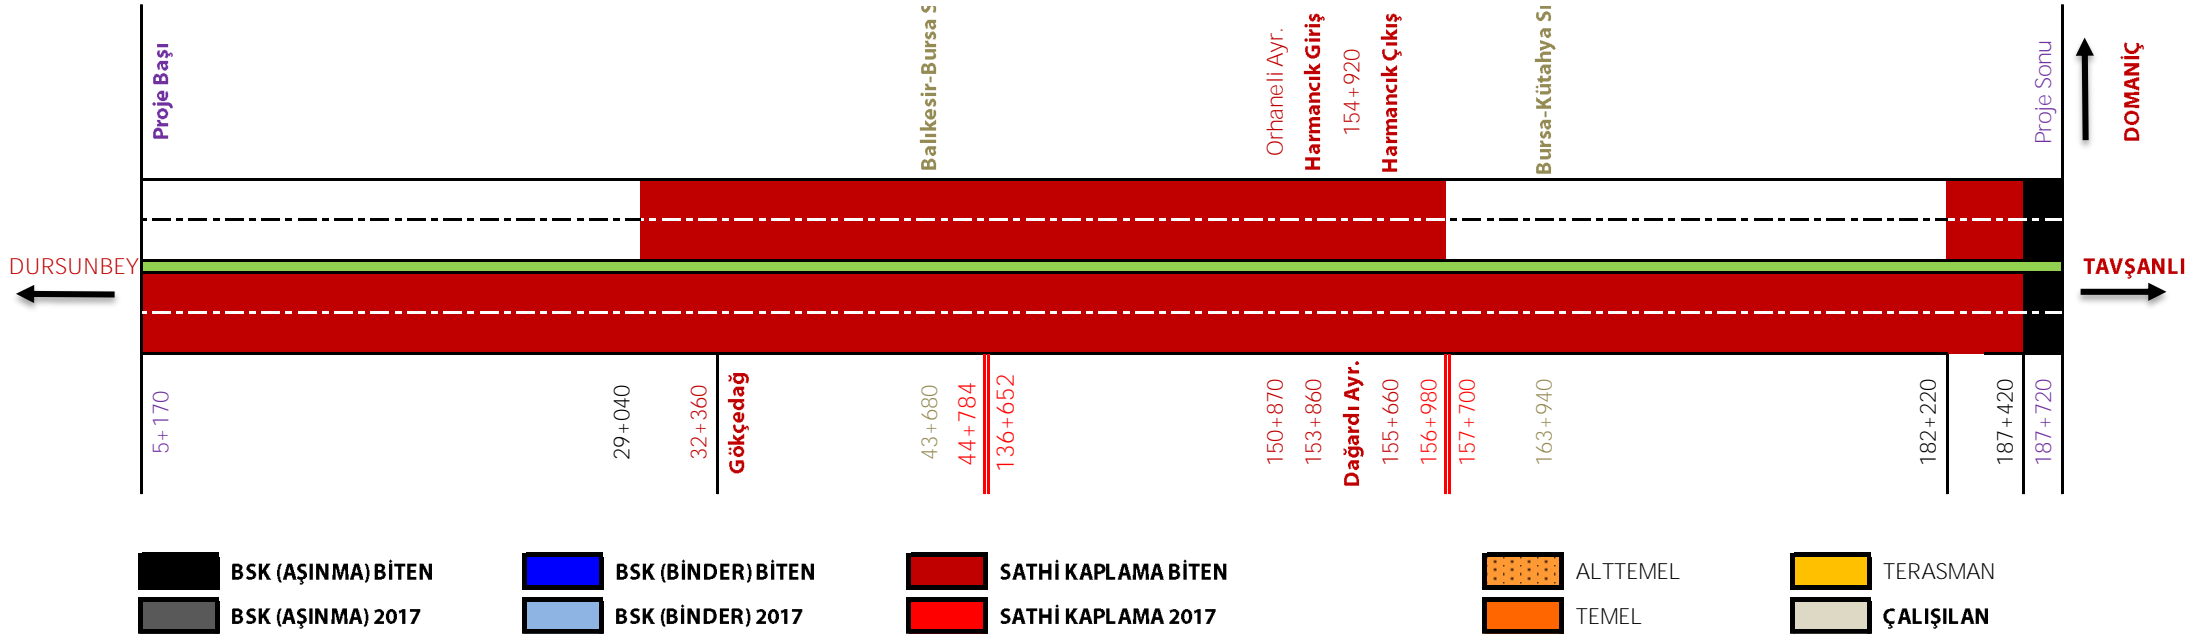


## ABİDE-SİMAV YOLU, ABİDE-PAZARLAR ARASI

Proje Uzunluğu :	15 km
Standardı :	BY-BSK
Proje Bedeli :	170.000.000 TL
Yüklenici :	<b>İHALE AŞAMASINDA</b>

TOPLAM	2016 SONU	2017 HEDEF	2017 BİTEN	KALAN
<b>BY ÇALIŞMALARI</b>				
15	0	0	0	15
<b>BSK ÇALIŞMALARI</b>				
15	0	0	0	15



1-) Abide-Simav Yolu, Km: 114+700-129+680 Arası ihalesi 30.05.2017 tarihinde yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir.

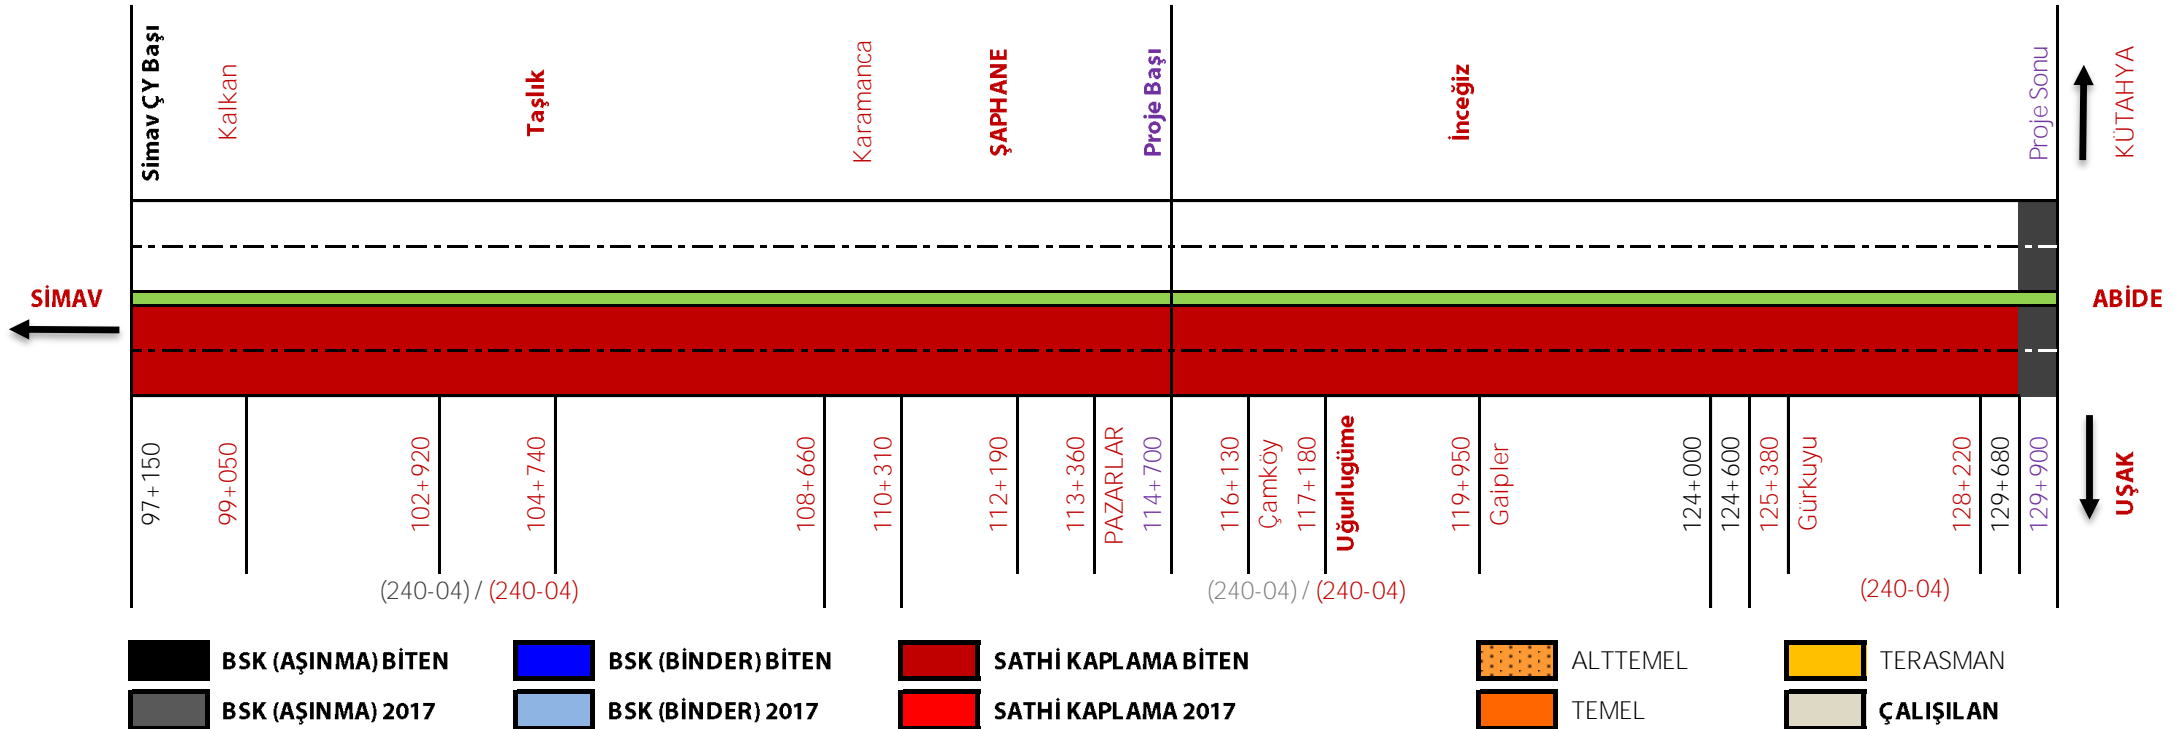


TUNÇBİLEK-DOMANIÇ YOLU	
Proje Uzunluğu :	26,2 km
Standardı :	TY, BY - SK
Proje Bedeli :	25.187.000 TL

TOPLAM	2016	2017 HEDEF	2017 BİTEN	KALAN
BY ÇALIŞMALARI				
4,4	0	0	0	4,4
TY ÇALIŞMALARI				
21,8	11	4	0	10,8



- 1-) Tunçbilek-Domaniç Arası Kesimde 2017 yılında 4 km TY-SK yol yapımı hedeflenmiştir.
- 2-) Tavşanlı-Tunçbilek (Tunçbilek ŞG Dahil) Arası BSK İkmal ihalesi 02.05.2017 tarihinde yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir.

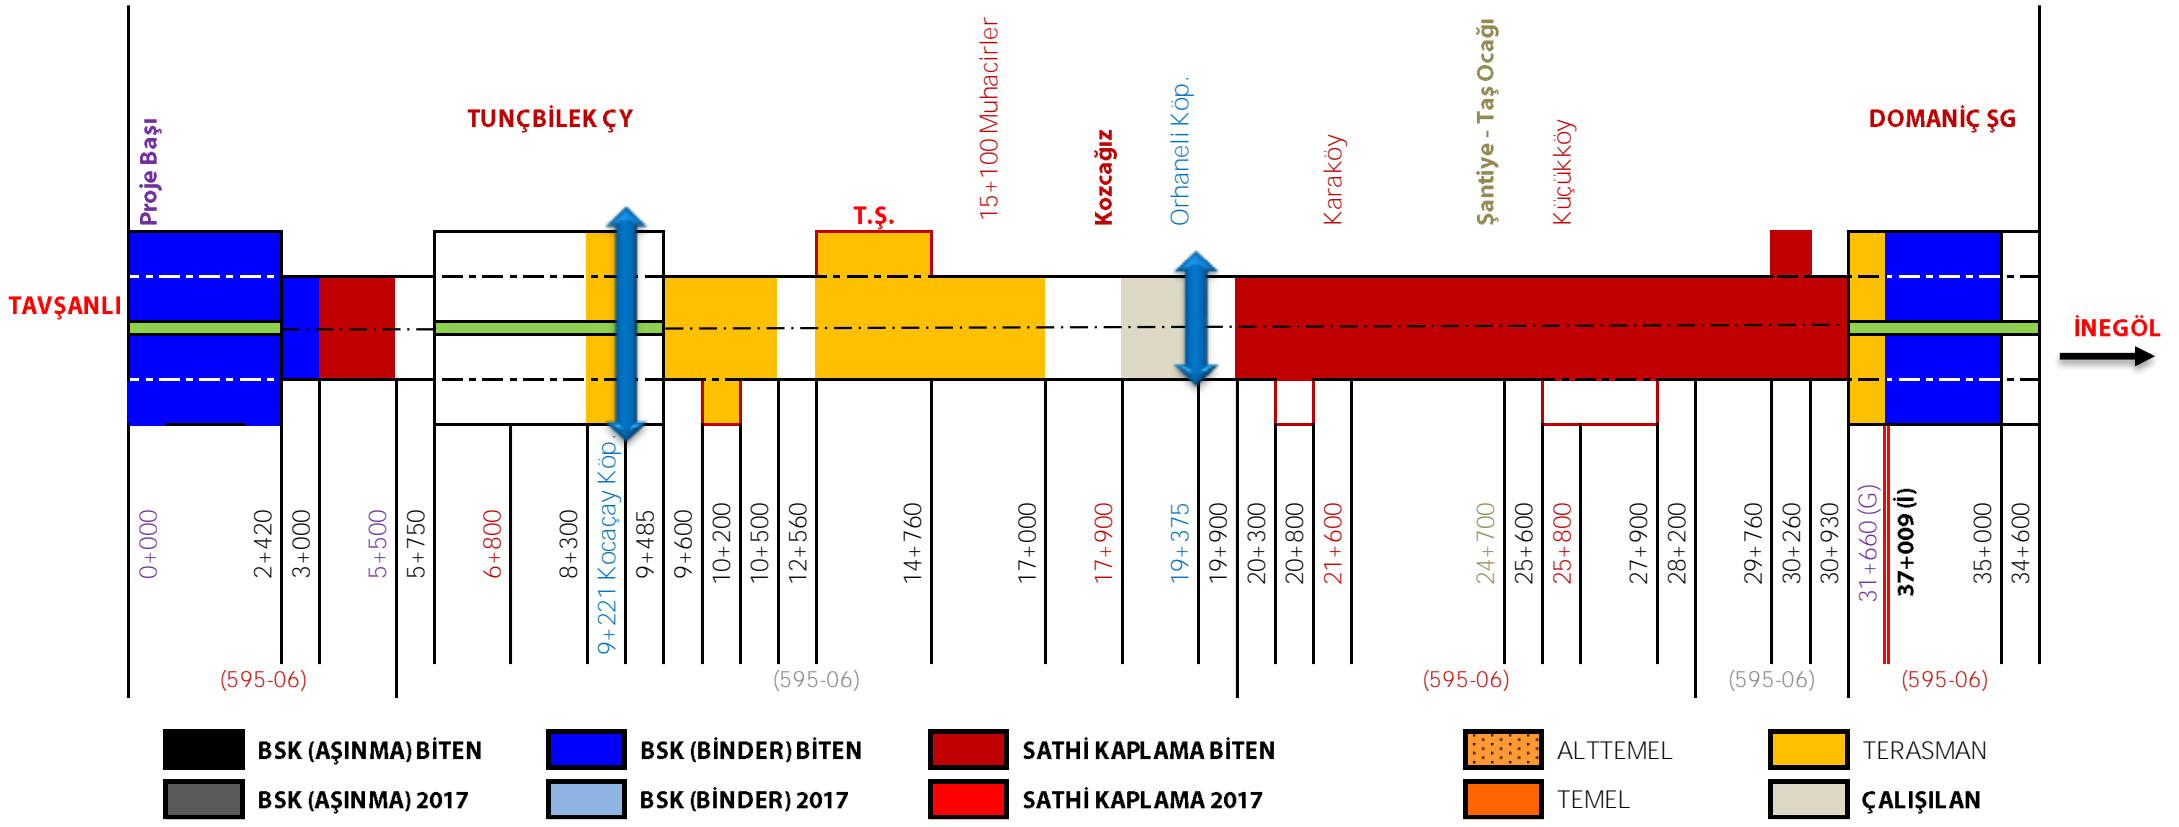



# TUNÇBİLEK – DOMANIÇ YOLU




ÇAVDARHİSAR-ÖRENCİK-EMET AYR. İKMAL İNŞAATI		
Proje Uzunluğu	:	30,2 km
Standardı	:	TY-SK
Proje Bedeli	:	29.671.000 TL

TOPLAM	2016 SONU	2017 HEDEF	2017 BİTEN	KALAN
30,2	1,8	5	0	28,4
TY ÇALIŞMALARI				
30,2	1,8	5	0	28,4



1-) 2017 yılında 5 km TY-SK yol yapımı hedeflenmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

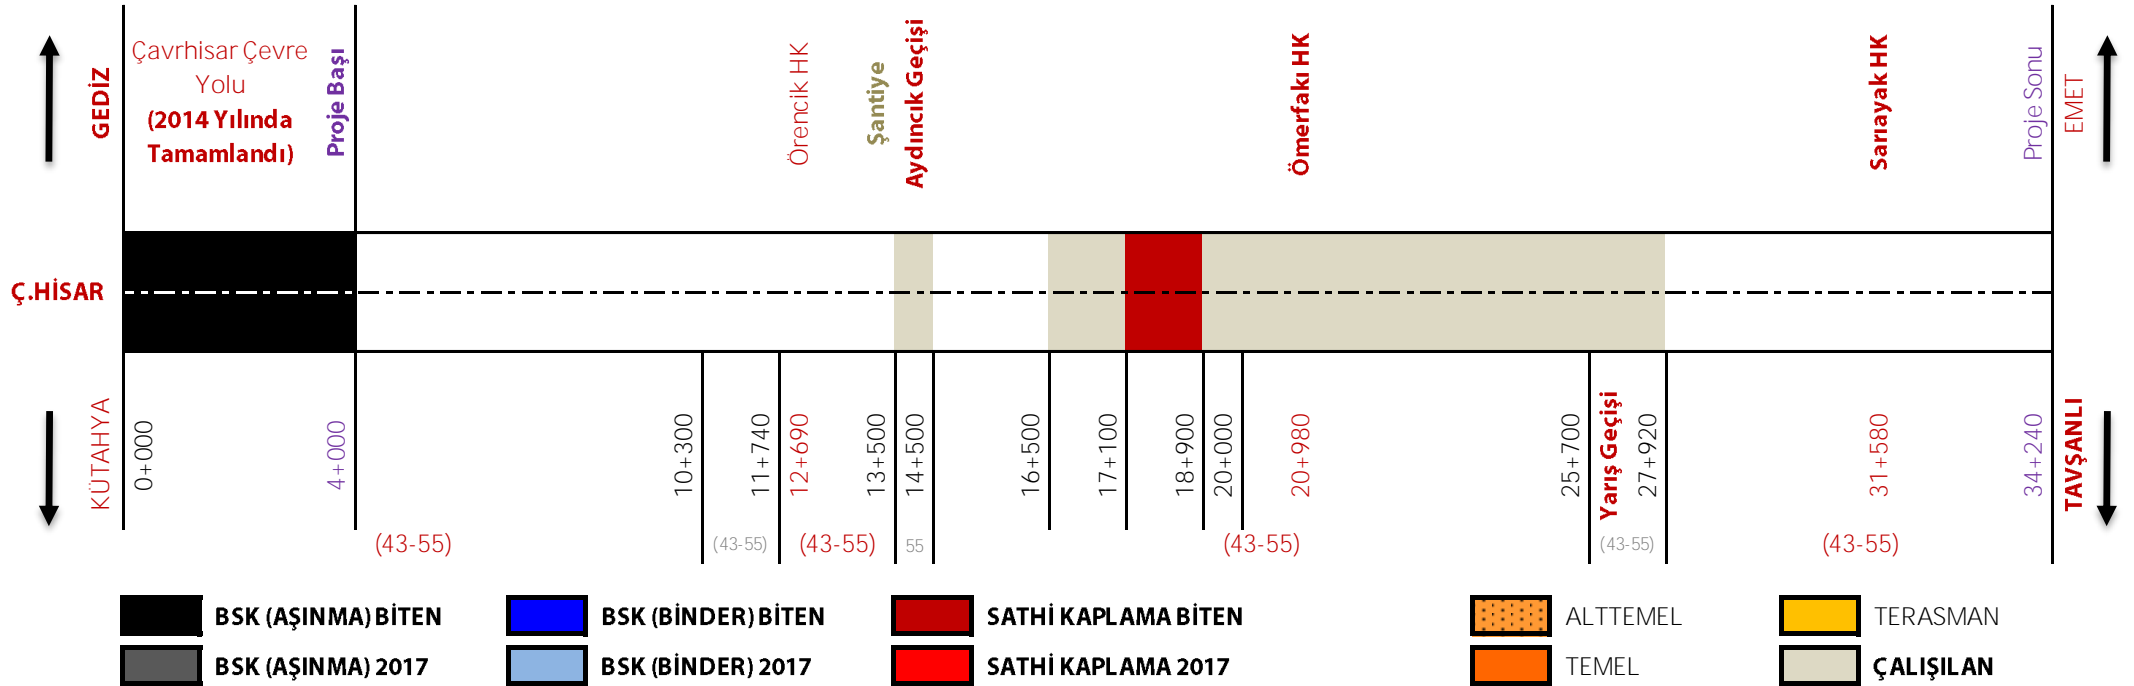

# ÇAVDARHİSAR – ÖRENCİK – EMET AYR.



## SİMAV-DAĞARDI KM: 57+000-67+000 ARASI

Proje Uzunluğu : 10 km


Standardı : TY-SK

Proje Bedeli : 11.543.000 TL


TOPLAM	2016 SONU	2017 HEDEF	2017 BİTEN	KALAN
TY ÇALIŞMALARI				
10	0	5	0	10



1-) 2017 yılında 5 km TY-SK yol yapımı hedeflenmiştir.

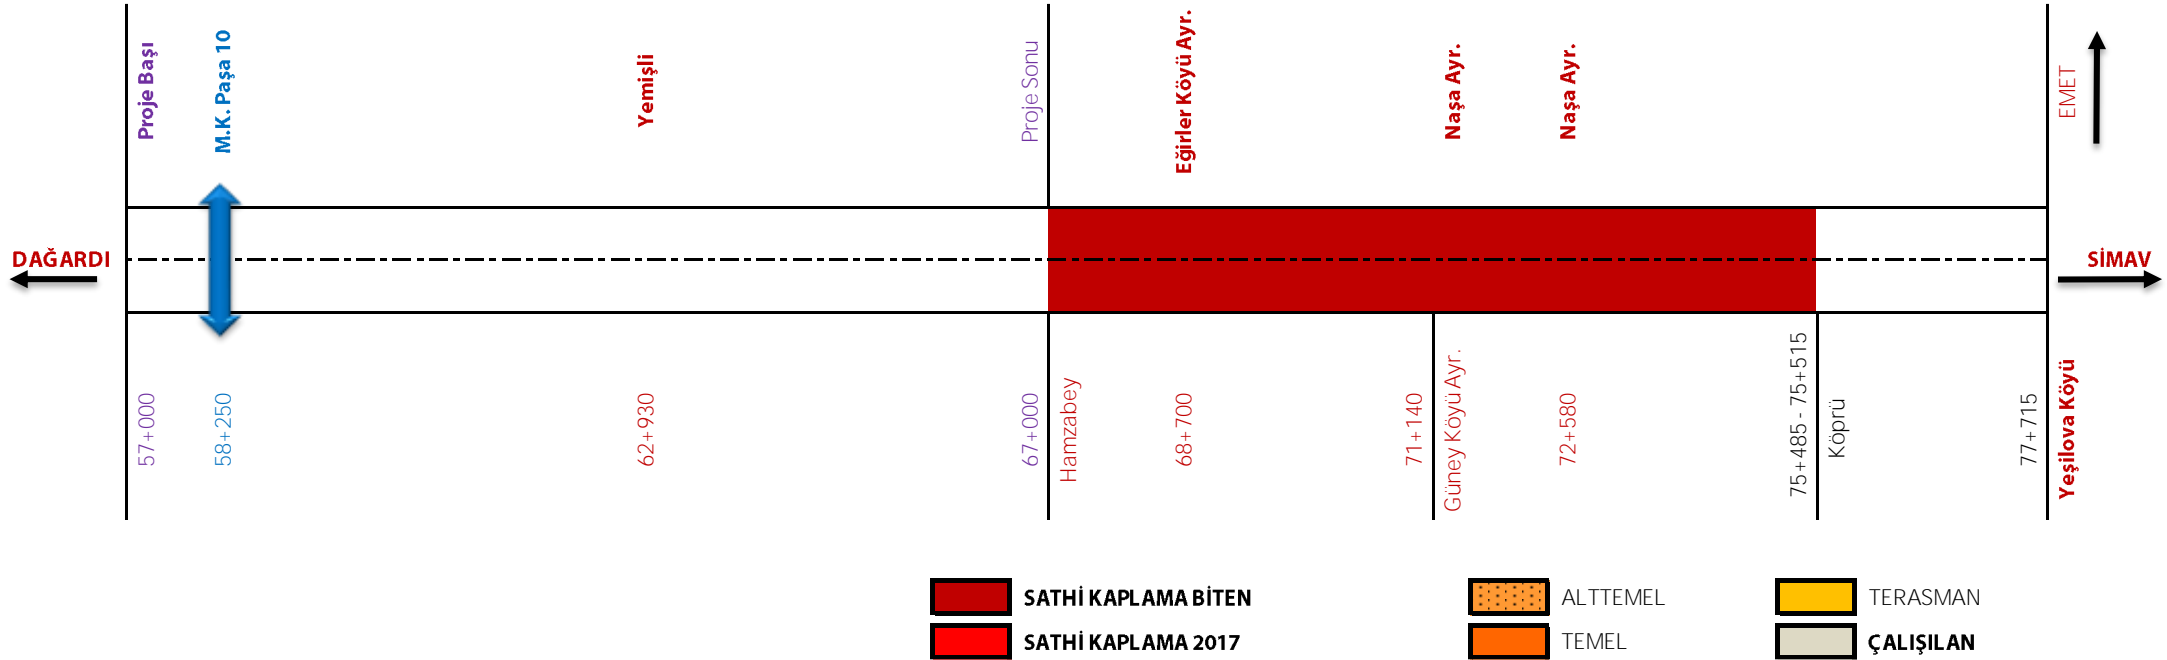

# TAVŞANLI – EMET – SİMAV YOLU (84,7 Km)

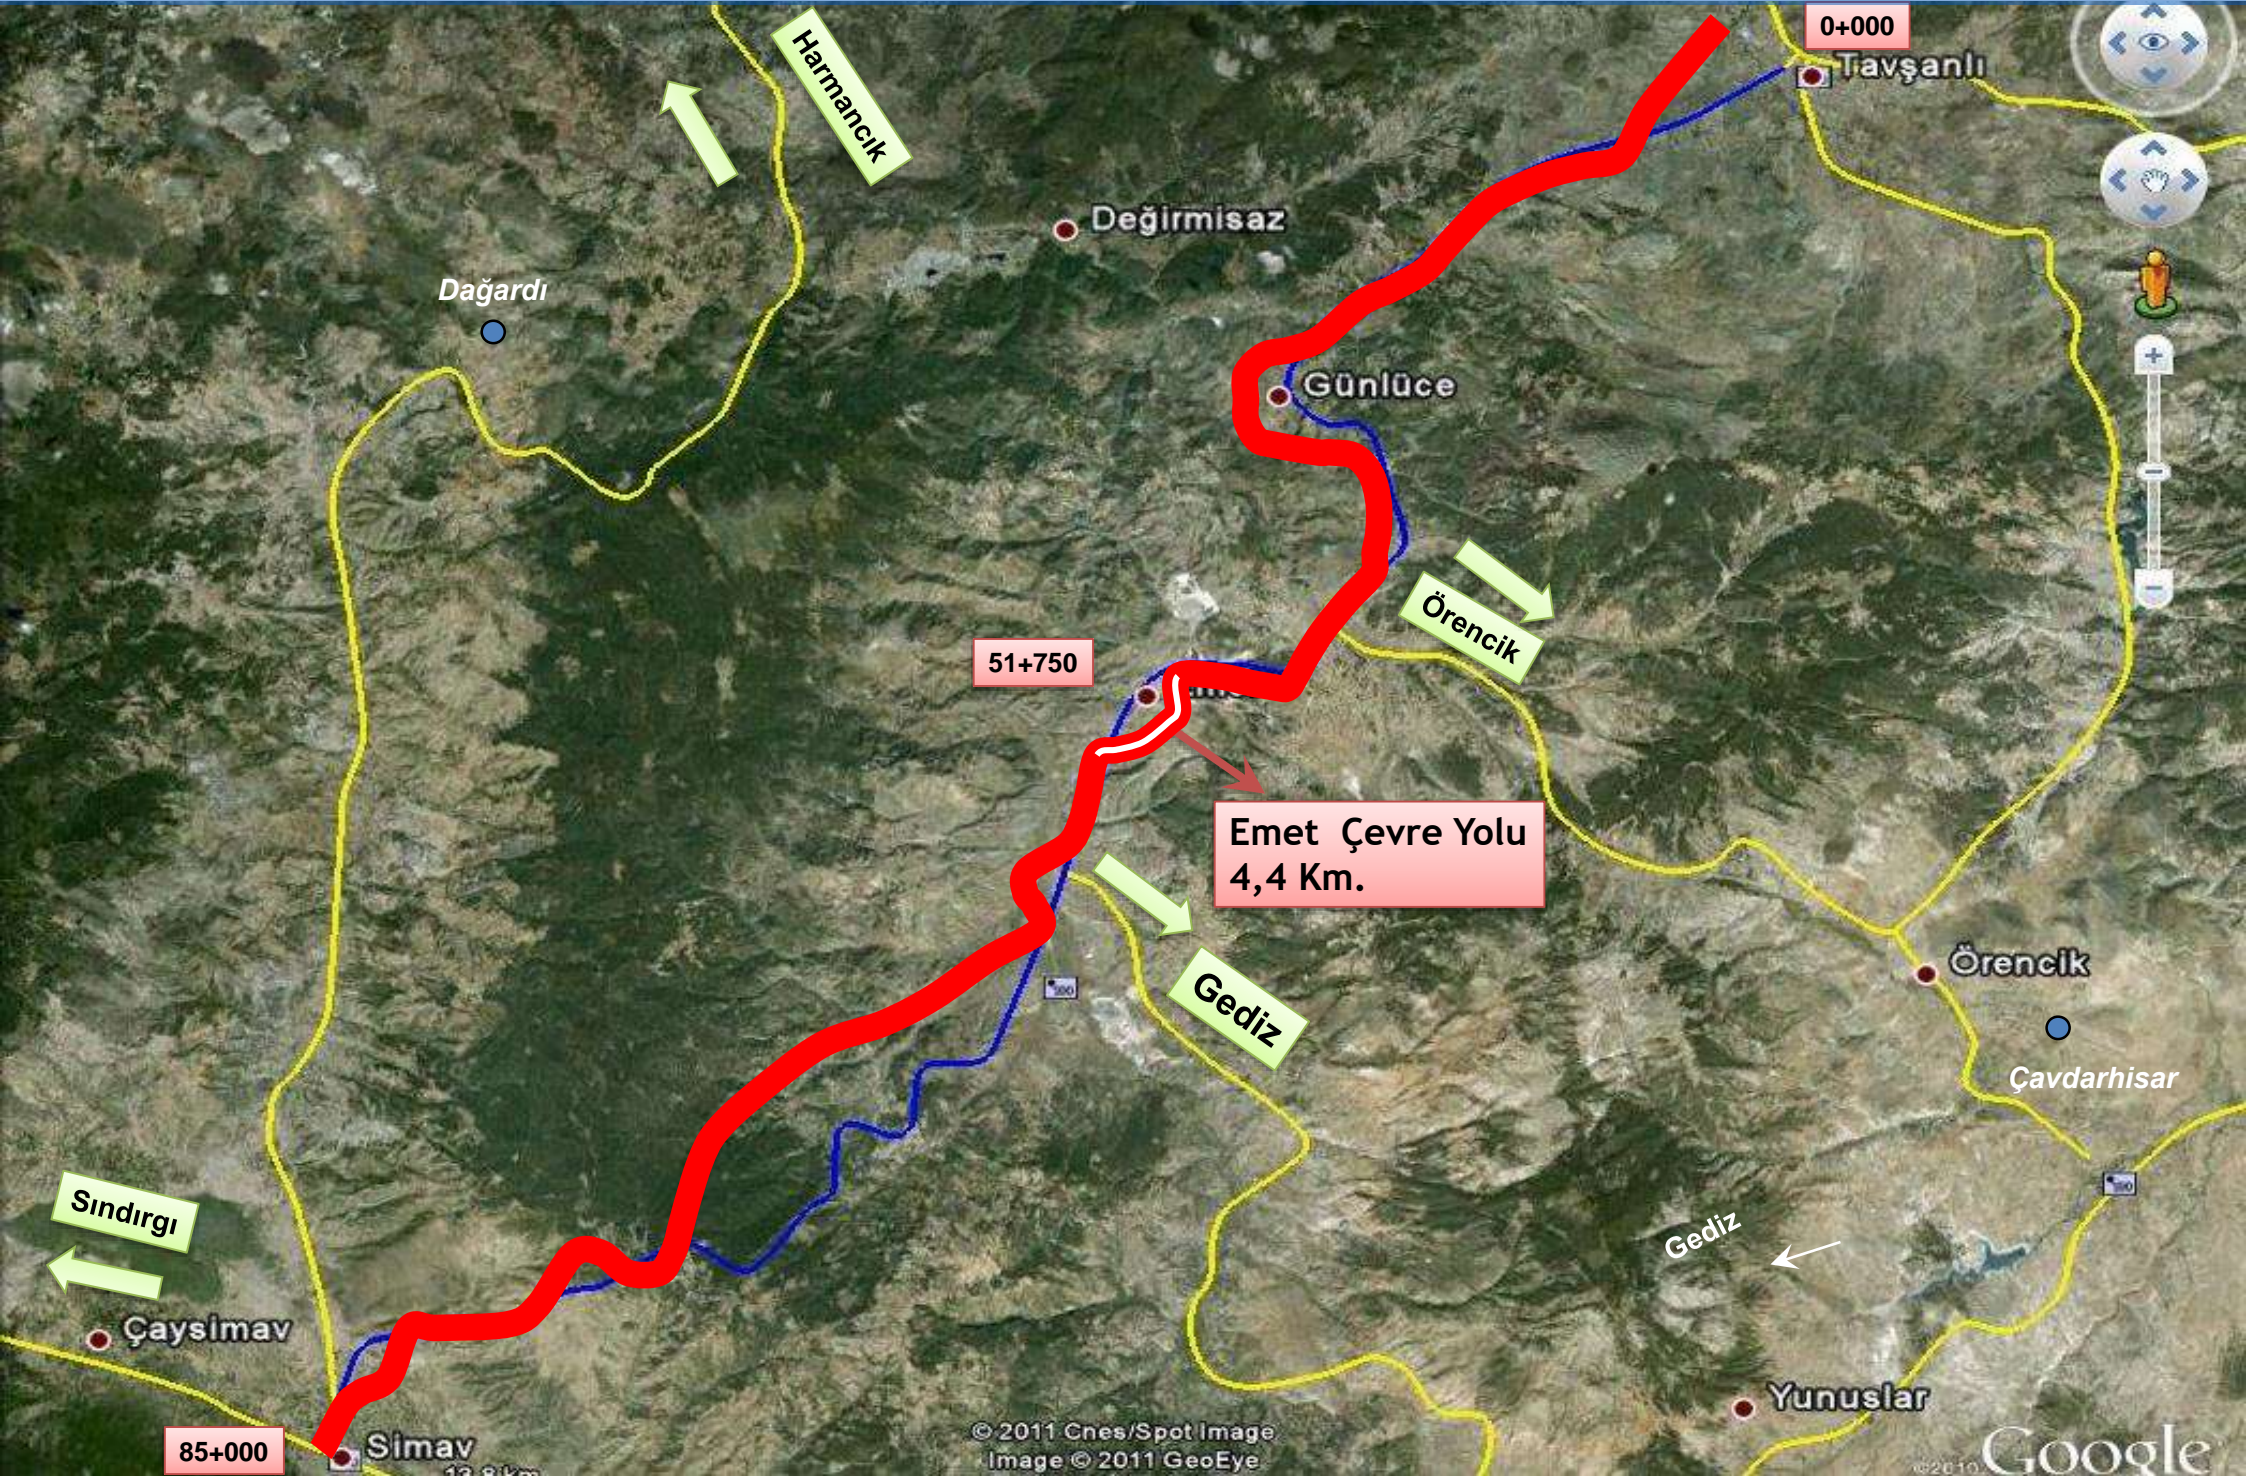

## TAVŞANLI-EMET KM: 0+000-19+000

Proje Uzunluğu : 51,7 km


Standardı : TY, BY - SK

Proje Bedeli : 97.230.000 TL

TOPLAM	2016 SONU	2017 HEDEF	2017 BİTEN	KALAN
BY ÇALIŞMALARI				
6,6	1,7	1,8	0	4,9
TY ÇALIŞMALARI				
45,1	13,5	3,2	0	31,6



1-) 2017 yılında Km: 0+000-5+000 arası 5 km (1,8 km BY ve 3,2 km TY) **yol yapımı** hedeflenmiştir.

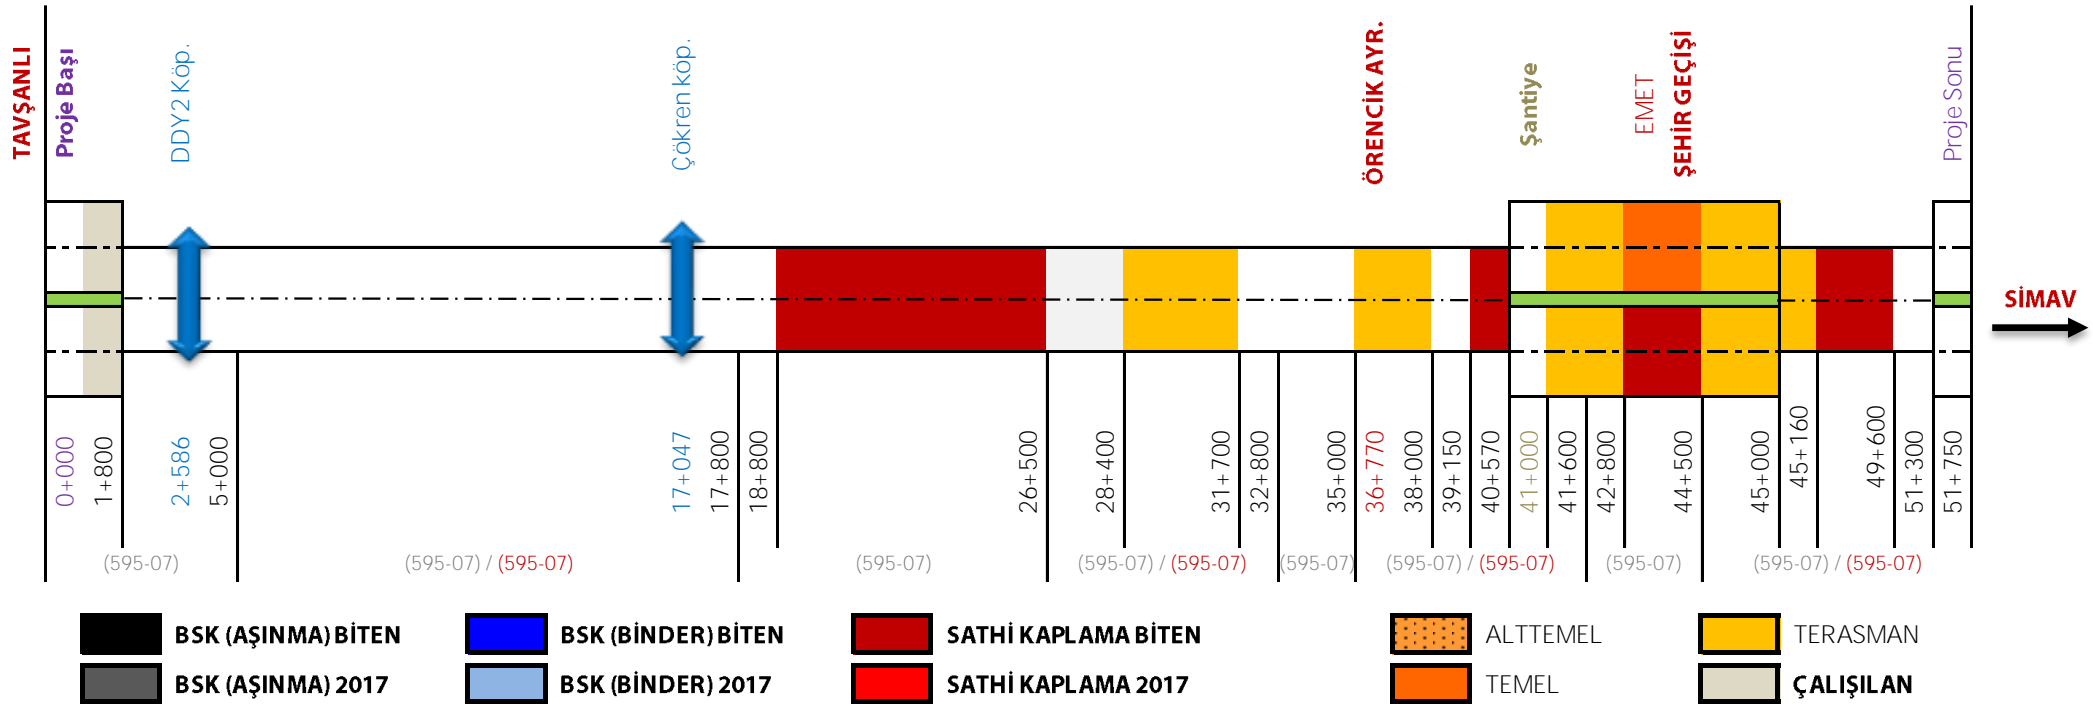


# HİSARCİK-EMET İKMAL İNŞAATI

Proje Uzunluğu	:	33 km
Standardı	:	TY, BY - SK
Proje Bedeli	:	98.820.000 TL

TOPLAM	2016 SONU	2017 HEDEF	2017 BİTEN	KALAN
BY ÇALIŞMALARI				
4,9	2,4	0	0	2,5
TY ÇALIŞMALARI				
28,1	8,6	0	0	19,5



1-) Yükleniciyle sözleşme imzalanmış olup çalışmalara başlanmıştır.

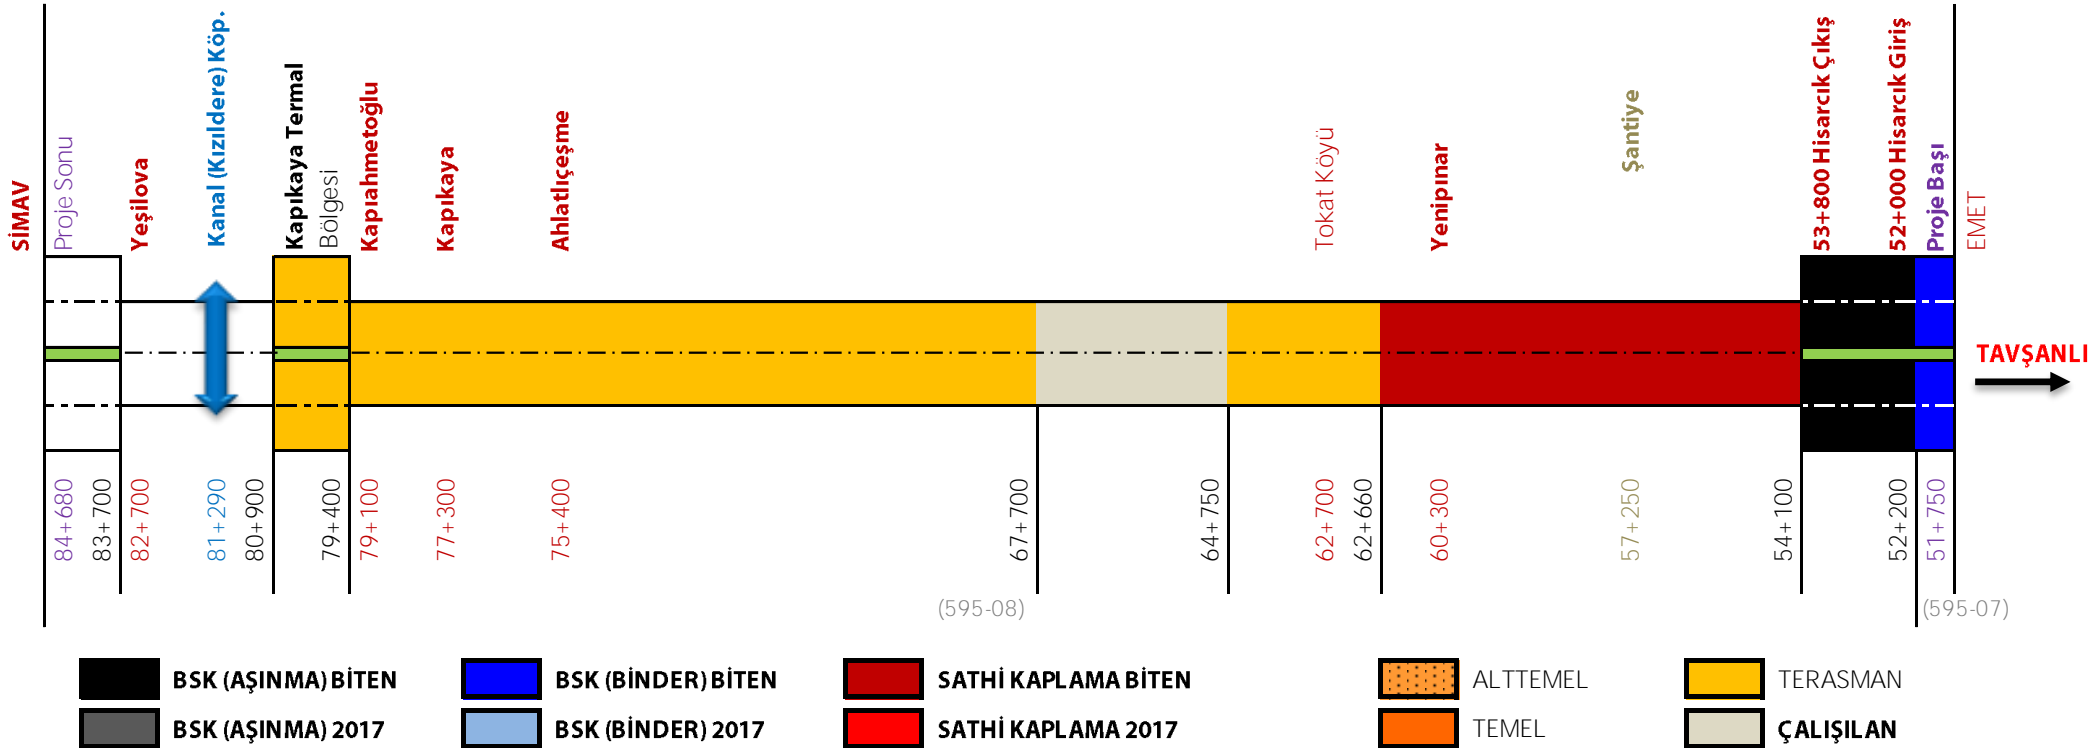

# HİSARCIK – SİMAV İKİMAL İNŞAATI





# KÜTAHYA-TAVŞANLI YOLU EKSİK KALAN İŞLER KAVŞAKLAR

## KÜTAHYA-TAVŞANLI YOLU EKSİK KALAN İŞLER KAVŞAKLAR

Proje Bedeli : 10.564.000 TL

Çobanköy ve Örenköy hemzemin kavşak düzenlemeleri tamamlanmış olup Devekayası kavşağında çalışmalar sürdürülmektedir.

# BOZÜYÜK-KÜTAHYA-AFYON YOLU KAVŞAK İŞLERİ



**BOZÜYÜK-KÜTAHYA-AFYON YOLU KAVŞAK İŞLERİ**  
Proje Bedeli : 5.035.000 TL  
Bozüyük ve Akpınar kavşak düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir.

# TARİHİ KÖPRÜ RESTORASYON ÇALIŞMALARI



TARİHİ YUKARI ve AİZONAI KÖPRÜSÜ

Proje Bedeli : 1.434.000 TL

**Aizonai Köprüsüne ait revize projeler Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 26.10.2016 tarihinde onaylanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Yukarı Köprüde revize proje**

## KÜTAHYA 2. ÇEVRE YOLU



TAVŞANLI

ESKİŞEHİR  
BİLECİK

KÜTAHYA

AFYON

KÜTAHYA 2. ÇEVRE YOLU (39,5 km BY-BSK)

Standardı : (2x2)

Kavşak : 15 adet FSK

Köprü : 11 adet toplam 624 metre

2017 YILI YATIRIM PROGRAMINDA

“Azot-Seyitömer arası 19 km. yol yenilemesi işi”

Proje Tutarı: 18.768.036 TL





ALAYUNT - BALIKESİR HATTI KM:11+264'DA KARAYOLU ALTGEÇİT YAPILMASI  
(KÜTAHYA-MERKEZ ATATÜRK)

İhale Bedeli :7.578.249 TL



İhale Bedeli: 8.615.844 TL







Kütahya Belediyesi tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarının bitmesine müteakip ihalesine çıkılacaktır.



İhale Bedeli: 2.962.788 TL



2017. 4. 5



Kütahya Belediyesi tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarının bitmesine müteakip ihalesine çıkılacaktır.



ALAYUNT - BALIKESİR HATTI KM:59+886'DA BULUNAN HEMZEMİN  
GEÇİT İÇİN ÜSTGEÇİT YAPILMASI (TAVŞANLI-EMET)

Sözleşme Tarihi	11.04.2017
Yer Teslimi	20.04.2017
İşin Süresi	300 gün
İşin Bitim Tarihi (Süre uzatımları dahil)	13.02.2018
Sözleşme Bedeli	14.189.676,34 TL

Diğer kurumlara ait alt yapı deplaselerinin tamamlanmasına müteakip üst geçit inşasına başlanacaktır.





Sözleşme Bedeli : 6.633.003 TL

Diğer kurumlara ait alt yapı deplaselerinin tamamlanmasına müteakip üst geçit inşasına başlanacaktır.





Kütahya İl sınırları içerisinde 20 adet otomatik bariyerli, 3 adet bekçili bariyerli, 146 adet çapraz işaretli (serbest) geçit ve 1 adet uzaktan idareli bariyerli olmak üzere Toplam: 170 adet hemzemin geçit bulunmaktadır. 2017 yatırım programında 22 adet hemzemin geçidin kauçuk kaplaması yapılacaktır.



330 km'lik hat kesimin elektrifikasyon işi 5 kısım halinde ihale edilmiştir.



Sözleşme Tarihi 05.06.2012

Yer Teslimi 21.06.2012

İşin Süresi 600 Gün

İş Bitim Tarihi 08.05.2018 (Son süre uzatımına göre)

İhale Bedeli 114.521.640 TL

Projenin ilerleme durumu fiziki % 83, parasal % 91 dur.





340 Km' lik hat kesiminde Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon tek parça halinde ihale edilmiştir.

Sözleşme bedeli	89.790.684 €
Parasal İlerleme %	74
Fiziki İlerleme %	52



\* Eskişehir Alayunt Hat kesimi montajlar ve testler tamamlandı. Testlerde belirlenen Hemzemin Geçit problemlerinin çözülmesi bekleniliyor

- Alayunt Gökçedağ Hat kesimi montajları (Makas Motorları Hariç) tamamlandı.
- Yüklenici yeni şantiye kurma çalışmalarına devam ediyor.

Projenin iş bitiş tarihi: 20.03.2017  
Süre uzatımı onay sürecinde

Sözleşme Tarihi 03.11.2011

Yer Teslimi 17.11.2011

İşin Süresi 1080 Gün

İş Bitim Tarihi 20.03.2017 (Süre uzatımı onay sürecinde)

İhale Bedeli 89.790.684 € ( ~359 milyon TL)

Projenin ilerleme durumu fiziki % 52, parasal % 74 dir.







- ✓ Etüt-Proje, Fizibilite Etüdü ve ÇED Raporu çalışmalarının Toplam Proje Bedeli 35.570.000 TL olup, 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
- ✓ Geliştirilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli proje 3 kesim halinde projelendirilmiştir.
  1. Eskişehir-Afyonkarahisar (140 km); kesiminin 1/5.000'lik güzergâh belirleme çalışmaları tamamlanmak üzeredir.
  2. Afyonkarahisar-Burdur (150 km); 06.02.2017 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.
  3. Burdur-Antalya(150 km); kesiminin kesin proje hazırlama işi için yüklenici firmaya 30.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

# İL ÖZEL İDARESİ

## KÖY YOLLARI YATIRIMLARI

### (Özel İdare & Köydes & Bakanlık)

Yılı Ödeneği **36.071.721**

Proje Durumu	İş (Adet)	Uyg. %'si
Biten	37	<b>% 40</b>
Devam Eden	79	
Başlanmayan	41	
İhale aşamasında	1	
<b>Toplam Proje sayısı</b>	<b>158</b>	

İşin Adı	Prg.	Uyg.	%
Sıcak Asfalt (km.)	107	57	53
1.Kat Asfalt (km.)	122,7	11	9
2.Kat Asfalt (km.)	25.5	0	0
Alt Yapı Güçlendirme(km.)	121	50,8	42
Onarım (km.)	78	37,5	48
Asfalt Bakım(Yama)(km.)	1.350	515	38
Trafik İşareti ve Yön Levhası (ad)	643	643	100

Yol Sektöründe km. bazında % 40 fiziki gerçekleştirilmiştir



**Merkez-İhsaniye-Kızılcaören-Sevdiğin BSK çalışması**



**Simav-İly.ilt-Yağıllar- Kiçir –Kızılçık BSK çalışmaları tamamlandı.**



Simav-Boğazköy BSK Sıcak asfalt çalışması



Şaphane-Gaipler BSK Sıcak asfalt çalışması
